

Cierre de sprint 05/04/2024


Objetivos

1. Resumen histórico de los avances de la semana
2. Resolver dudas presentadas
3. Compromisos en caso de existir

Objetivo del Sprint

- PE188-35: Checkout Ecommerce **IN PROGRESS**
- PE188-17: Ingreso de venta a ERP SAP **IN PROGRESS**
- PE188-36: Página de Carro de compra (Cart, Ecommerce) **DONE**
- PE188-14: Validación de stock previo a la inyección de venta **PAUSED**
- PE188-15: Integración Stock ecommerce **DONE**

Planificación inicial

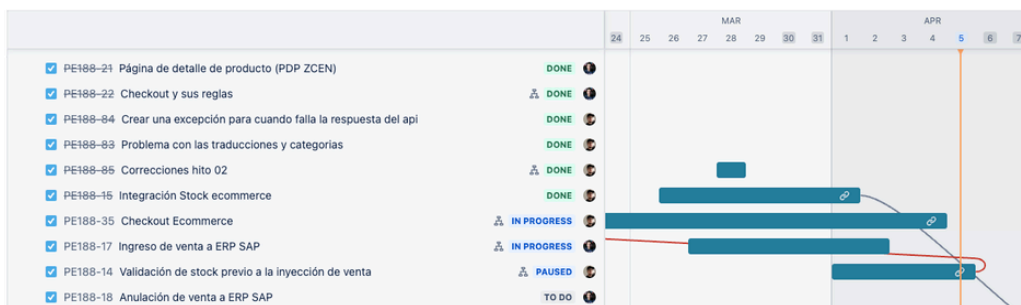

Cuadro de avances

Logrados

- PE188-85: Correcciones hito 02 **DONE**
- PE188-15: Integración Stock ecommerce **DONE**
- PE188-22: Checkout y sus reglas **DONE**
 - PE188-77: La compra mínima debe ser mayor a 4 UTM por Proveedor **DONE**
 - PE188-78: El Carro deberá estar relacionado al organismo "Destinatario" y al "Canal" **DONE**
 - PE188-76: Agrupar productos por Proveedor. **DONE**
- PE188-36: Página de Carro de compra (Cart, Ecommerce) **DONE**
 - PE188-80: Resumen de compra por proveedor **DONE**
 - PE188-79: Listado de productos agrupados por proveedores **DONE**
 - PE188-81: Validación por monto mínimo de compra **DONE**
- PE188-35: Checkout Ecommerce **IN PROGRESS**
 - PE188-86: Sidebar de pasos maquetacion **DONE**
 - PE188-87: Formulario de datos de solicitante **IN PROGRESS**
 - PE188-88: Formulario de Destinatario **IN PROGRESS**

- PE188-17: Ingreso de venta a ERP SAP **IN PROGRESS**
 - PE188-96: Conectarse al api **DONE**
 - PE188-97: Evaluar la respuesta **DONE**
 - PE188-100: Guardar un log de la respuesta (Esto es opcional tenemos que hablarlo) **DONE**
 - PE188-99: Integrar el request al checkout **DONE**
- PE188-14: Validación de stock previo a la inyección de venta **PAUSED**
 - PE188-101: Conectarnos con el endpoint **DONE**
 - PE188-102: Evaluar la respuesta **DONE**

i En proceso

1. PE188-35: Checkout Ecommerce **IN PROGRESS**
 - a. PE188-91: Método de entrega **IN PROGRESS**
 - b. PE188-106: Puesto de descarga **IN PROGRESS**

! Comentarios

- Tareas para el siguiente sprint
 - PE188-18: Anulación de venta a ERP SAP **TO DO**
 - Del hito 1 dejamos pendiente el "Login de proveedor". Cuando se logea un usuario proveedor, éste debería ser redirigido al panel de administración, y poder visualizar sus productos y pedidos.
 - ¿Al parecer no es posible modificar las categorías principales desde el panel de admin?
 - El buscador no funciona. Ideal sería buscar por nombre y SKU. (image).
 - El contador de unidades del ícono del carro no funciona. (image)
 - El carro de la tienda de intermediación me da este error.
- Validar si la inserción de los pedidos va a una cola o no ?

Notas	documentos adicionales del proyecto
Links	<ul style="list-style-type: none"> • Anexos 1 https://drive.google.com/file/d/1vxxQzi3_Zp_ke4PA-Z8FuqlRiYPkE/Psc/view?usp=drive_link Connect your Google account • Acuerdos https://drive.google.com/file/d/1v568fa3_4PzS9nunt9hjTeNG9uaoS4i/L/view?usp=drive_link Connect your Google account

3	d) Carro de Compra Canal: "01 intermediación". e) Pedido de Venta Checkout para canal "Intermediación". Validar stock con API. Inyectar Pedido de Venta vía API. Anular Pedido de Venta vía API.	40%
---	---	-----

objetivos hito 3

